



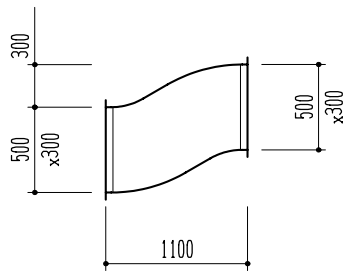






現場名	ビル新築工事	発注日	2009年10月 1日
		納期	2009年11月 1日
共通仕様	(ダクト材) 亜鉛鉄板	担当者	株式会社 四電工
	(保温) 有り (はぜ) ホタパン (工法) 共板	製作社名	製作
特記		取付社名	設備

No.	SA-1	- 7	No.	SA-1	- 8	No.	SA-1	- 10				
数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	
1	1.0		四隅	1	0.8		四隅	1	0.8		四隅	
<b>ホッパー</b> フラジ 			<b>内R外Rエルボ</b> 			<b>内R外Rエルボ</b> 						
<b>直ダクト 開口あり 非定尺</b> 			<b>正面</b> 			<b>背面</b> 						
<b>直ダクト 開口あり 非定尺</b> 四方 			<b>正面</b> 			<b>背面</b> 						
<b>内R外R S字</b> 			<b>ホッパー</b> 地平 			<b>内R外R S字</b> 						
面積 ( m <sup>2</sup> )			0.5	0.6			0.8	27.5	1.0	7.7	1.2	1.6

現場名	ビル新築工事	発注日	2009年10月 1日
		納期	2009年11月 1日
共通仕様	(ダクト材) 亜鉛鉄板	担当者	株式会社 四電工
	(保温) 有り (はぜ) ホタパン (工法) 共板	製作社名	製作
特記		取付社名	設備

No.	SA-1	- 17			No.	SA-1	- 18			No.	-				
数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール
1	0.6		四隅	1	0.6		四隅								
ヒョットコ片直 ヒョットコ 				直ダクト 開口あり 定尺 				正面 							
No.	SA-1	- 20			No.	SA-1	- 21			No.	SA-1	- 22			
数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール
1	0.6		四隅	1	0.6		四隅	1	0.6		四隅				
内R外RS字 				内R外RS字 				直ダクト 開口あり 定尺 							
No.	-				No.	SA-1	- 23			No.	-				
数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール	数量	板厚	補強リブ	シール
				1	0.6		四隅								
背面 				直ダクト 開口あり 非定尺 				正面 							
面積 ( m <sup>2</sup> )		0.5	0.6	13.1	0.8	1.0	1.2	1.6							

